


PIIPPOLAN VIRKISTYSALUEIDEN KEHITTÄMISHANKE



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



LOPPURAPORTTI 2014
Haapaveden – Siikalatvan
seudun kuntayhtymä

1. Hankkeen tiedot

Hankkeen toteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Keskustie 29
92620 Piippola

Hankkeen nimi: Piippolan virkistysalueiden kehittämishanke

Hankkeen numero: 17610

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Toimintalinja: Leader, koordinoiva toimintaryhmä Keskipiste-Leader ry

Kohdealue: Siikalatva

Vastuullinen johtaja: Seutukuntajohtaja Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta

Yhteenveto

Hankkeessa rakennettiin Siikalatvan kunnan Piippolan kirkonkylään lähiliikuntapaikkakokonaisuus, joka koostuu Väinölään jokirannan virkistysalueesta (laituri ja aidattu polku), Pappilanniemen luontopolusta sekä Piippolan kyläkeskuksen lähiliikuntapaikasta, johon kuuluvat golfiin harjoituslyöntialue, hiihtomaa, frisbiigolfin maalialue sekä jousiammuntapaikka.

Hanke käynnistyi paikallisen asumisviihtyvyyttä parantavan ideoinnin tuloksena ja hankkeessa oli useita paikallisia toimijoita. Hankkeen tuloksena syntyi alueen asumisviihtyvyyttä edistävää yhteistyöverkosto.

Hankkeen hallinnoijana toimi Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja rahoittajana oli Keskipiste-Leader ry. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2012–31.12.2014.

kannen kuva: Pappilanniemen luontopolku syysasussa (kuva Markku Lesonen).

2. Raportti

2.1. Hankkeen tausta ja tavoitteet

Piippolan virkistysalueiden kehittämishanke käynnistyi Piippolassa syksyllä 2011 paikallisen asumisviihtyvyyden parantamista koskevan ideoinnin tuloksena. Ideointi oli osa Keskipiste-Leaderin yhteisöhautomohanketta. Taustalla oli Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kuntien yhdistyminen uudeksi Siikalatvan kunnaksi. Entisen kuntakeskusten, nykyisten kirkonkyläiden, asumisviihtyvyyttä haluttiin parantaa. Aikaisemmin vastaavaa kehittämistoimintaa oli ollut useissa sivukylissä, mutta kuntakeskuksissa asumisviihtyvyyteen ei aina oltu kiinnitetty samalla tavalla huomiota.

Piippolan keskustassa, kirkon ja seurakuntatalon maisemissa - Pappilanniemessä, oli jo pitkään nähty mahdollisen luontopolun paikaksi oivallisesti soveltuva reitti. Piippolassa, kuten useimmissa vastaavissa kirkonkylissä, oli puutetta turvallisesta, myös lapsille ja vanhuksille sopivasta ulkoilureitistä. Aikaisemmat kävelyreitit kulkivat ainakin osittain vilkkaasti liikenteisen kantatie 88:n varta.

Pappilanniemi on nimensä mukaisesti niemi, joka rajoittuu Lamujokeen. Etenkin lähistöllä asuvat vanhukset, mutta myös kylän lapset, ovat kaivanneet turvallista laituria jokivarteen hetken hiljentymisen mahdollistamaksi lepopaikaksi tai toisaalta oivaksi onkkipaikaksi.

Piippolan keskustasta on puuttunut lapsille ja aloittelijoille soveltuva hiihtopaikka, jossa voitaisiin tehokkaasta ja havainnollisesti opettaa hiihtotekniikoita mukaan lukien mäenlaskutaito. Samaan aikaan alueelle kaivattiin virinneen golfharrastuksen tueksi harjoituslyöntipaikkaa, johon kuuluisi myös puttausalue. Pulkkilan ja Haapavedelle rakennetut tasokkaat frisbeegoifradat ovat lisänneet alueen asukkaiden kiinnostusta lajiin. Golfiin harjoituslyöntialueen, hiihdon harjoittelualue ja frisbeegoiffin harjoitusradan nähtiin sopivan hyvin samalle alueelle ja täydentävän toisiaan siten, että ne muodostavat ympärivuotisen lähiliikuntapaikan.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa edellä mainittuihin tarpeisiin sopivat lähiliikuntapaikat.

2.2. Hankkeen toteutus

2.2.1. Toimenpiteet

Hanke jaettiin kolmeen osakokonaisuuteen, jotka ovat:

- Väinölän jokirannan virkistysalue (Piippolan Iltavirkku ry)
- Pappilanniemen luontopolku (Siikalatvan seurakunta)
- Piippolan kyläkeskuksen lähiliikuntapaikka (Siikalatvan kunta)

1. Väinölän jokirannan virkistysalue

Aloite tähän osioon tuli Piippolan Iltavirkku ry:ltä, jolla on omistuksessaan 42 asuntoa Piippolassa, mm. Pappilanniemen alueella. Yhdistyksen mukaan Piippolan keskustaantavittiin ikääntyneille, liikuntarajoitteisille ja erityisryhmille soveltuvaa ulkoilupaikkaa.

Hankkeessa rakennettiin pieni virkistysalue, joka liittyy kiinteästi Pappilanniemen luontopolkuun. Kohde koostuu laiturista ja lyhyestä polusta (kaiteella varustettu), joka mahdollistaa vanhuksen, nuorten ja liikuntarajoitteisten pääsyn Lamujoen rantaan.

Alla Väinölän jokirannan laituri (kuva Kaija Laukkanen)



Laituri kaiteineen ja siihen liittyvä polun osa rakennettiin. Rakentamistyö kilpailutettiin rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla.

2. Pappilanniemen luontopolku

Aloite tähän osioon tuli Siikalatvan seurakunnalta, joka omistaa Pappilanniemen maa-alueen ja jonka omistama Piippolan seurakuntatalo on keskeisellä paikalla aluetta.

Luontopolku rakennettiin niin, että se soveltuu kaiken ikäisille ja kuntoisille ulkoilijoille. siksi sen pinta rakennettiin kovaksi, tasaiseksi ja luistamattomaksi, eikä reitillä ole korkeuseroja. Rakennettu polku on 1-1,5 metriä leveä ja pituudeltaan noin 500 metriä.

Polun rakentaminen kilpailutettiin ja polku rakennettiin hankesuunnitelman mukaisesti.



Pappilanniemen luontopolku kanootin laskuluiskan kohdalla (kuva Markku Lesonen)

3. Piippolan kyläkeskuksen lähiliikuntapaikka

Aloite lähiliikuntapaikan rakentamiseen tuli Piippolan kirkonkylän kyläyhdistykseltä, Piippolan ammatti- ja kulttuuripistolta, urheiluseura Piippolan Terävältä ja Siikalatvan kunnalta. Tavoitteena oli laajalti kylän asukkaita palvelevan monipuolisen lähiliikuntapaikan rakentaminen.

Alueelle rakennettiin hiihtomaa, golfin harjoituslyöntialue ja greeni, frisbeegolfin maalialue ja jousiammuntapaikka. Jousiammuntapaikan rakentaminen ei edellyttänyt varsinaisia rakenteita vaan jousiammuntamahdollisuuden huomioon ottamisen alueen maanrakennustöissä.

Jousiammuntamaali on ennestään käytettävissä ja helposti alueelle tuotavissa.

Tehty työ muodostui alueen raivauksesta, maansiirto-, kaivaus- ja muotoilutöistä, greenin pohjätöistä ja keinonurmen asentamisesta sekä aidan (suojaverkko) asentamisesta. Alueella tehtiin myös kosteudenhallintaan liittyviä kaivuutöitä tarvittavine tarvikeseennuksineen (mm. rummut). Alueella on myös suunnitelman mukaiset valaisinpylväät.

Rakennustyöt ja materiaalihankinnat kilpailutettiin rahoituspäätöksen mukaisesti.



Harjoitusalueen keinonurmen asennustyöt (kuva Markku Lesonen)

2.2.2. Aikataulu

Hanke toteutettiin 1.5.2012-31.12.2014. Alkuperäinen hankkeen päättymisajankohta oli 31.12.2013, mutta hankkeelle haettiin jatkoaikaa, koska golfgreenin keinonurmen asentaminen oli mahdollista tehdä vain keväällä tai kesällä eivätkä maanrakennustyöt mahdollistaneet asennusta vuoden 2013 aikana.

2.2.3. Resurssit

Hankkeen resurssit käsittivät kohdealueena olleen Siikalatvan lähiliikuntapaikan, Pappilanniemen luontopolun ja Väinölännan alueet sekä merkittävän paikallisen yhteistyöverkoston.

2.2.4. Toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Vastuullinen johtaja: seutukuntajohtaja Hannu Saarinen

Kirjanpitäjä: Marja Pellikka

Toimistosihtööri: Helena Kesti

Hankkeen toteutusta valmisteli ja seurasi työryhmä, johon kuuluivat

Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Tarmo Myllykoski, Siikalatvan seurakunta

Toivo Haataja, Piippolan Iltavirkut ry.

Kaija Laukkanen, Piippolan Iltavirkut ry.

Markku Lesonen, Piippolan ammatti- ja kulttuuripisto

Toteutusalue: Siikalatvan kunta

2.2.5. Kustannukset ja rahoitus

Piippolan virkistysalueiden kehittämishanke
hankenumero 17610
Hankeaika 1.5.2012 - 31.12.2014

	Budjetti	%-osuus	kulut 2012	kulut 2013	I maksatus	Loppumaksatus	kulut yht.	jää
Rakentaminen	34 942,00 €	98,87 %	235,09 €	17 163,73 €	17 398,82 €	11 644,13 €	29 042,95 €	5 899,05 €
vastikkeeton työ	400,00 €	1,13 %	2,69 €	196,17 €	198,85 €	133,08 €	331,93 €	68,07 €
YHTEENSÄ	35 342,00 €	100,00 %	237,78 €	17 359,90 €	17 597,67 €	11 777,21 €	29 374,88 €	5 967,12 €
Raholtus							rah.yht.	jää
EU-valtio	22 574,71 €	63,87 %	151,88 €	11 087,77 €	11 240,51 €	7 522,69 €	18 763,20 €	3 811,51 €
Kunnat, Leader	3 931,87 €	11,13 %	26,45 €	1 931,33 €	1 957,78 €	1 310,24 €	3 268,02 €	663,85 €
Muu julkinen raholtus	5 743,00 €	16,2 %	38,64 €	2 820,94 €	2 859,58 €	1 913,77 €	4 773,35 €	969,65 €
Yksityinen; raha	2 692,42 €	7,6 %	18,12 €	1 322,82 €	1 340,95 €	897,42 €	2 238,37 €	454,05 €
Yksityinen; työ	400,00 €	1,1 %	2,69 €	196,17 €	198,85 €	133,08 €	331,93 €	68,07 €
Kokonaisrahoitus	35 342,00 €	100,0 %	237,78 €	17 359,90 €	17 597,67 €	11 777,21 €	29 374,88 €	5 967,12 €

2.2.6. Raportointi, seuranta ja tiedotus

Hankkeesta on raportoitu rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla ja hallinnoija on seurannut hankkeen toiminnan ja talouden toteutumista hankkeiden hallinnoinnista ohjeistetulla tavalla.

Hankkeen alkamisesta kerrottiin hallinnoijan www-sivuilla sekä hankkeen yhteistyökumppanien omilla tiedotuskanavilla. Hankkeen toteutuksen aikana hankkeen tuloksista kerrottiin paikallislehdessä. Hankkeen päättyessä laadittiin lehdistötiedote hankkeen tuloksista.

2.2.7. Toteutusolehtukset, riskit ja esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeessa on runsaasti toteuttajajäseniä, joilla kullakin oli omat selkeät tavoitteet ja työnjako. Toteuttajajäsenien mukana hankkeeseen osallistui suuri määrä alueen asukkaita. Selkeän työnjaon ansiosta jokainen toteuttajajäseni keskittyi vain omaan osakokonaisuuteensa ja tämä toimi hyvin.

Selkeän riskin hankkeelle aiheutti se, ettei sillä ollut palkattua projektipäällikköä. Hankkeen kokonaisuutena oli hankkeen vastuullisella johtajalla, joka ei kuitenkaan ollut substanssitoimija. Riskiä pyrittiin pienentämään nimeämällä hankkeelle työryhmä, joka osaltaan vastasi hankkeen toteutuksesta ja merkittäviä ongelmia projektipäällikön puuttumisesta ei näiltä osin aiheutunut.

Toinen selkeä riski oli se, että osa hankkeen toteuttajaosapuolista oli tottunut hanketyöhön eikä tuntenut hankkeiden käytännön toteutukseen liittyviä käytänteitä. Tästä aiheutui jonkin verran väärinkäsityksiä, jotka hidastivat hankkeen toteutusta. Kaikki suunnitellut toimenpiteet saatiin kuitenkin toteutettua hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti.

Jatkossa luontopolkua, laituria ja erityisesti liikuntapaikkoja täytyy markkinoida ja tehdä nykyistä paremmin tunnetuksi. Pienellä paikkakunnalla tämä onnistunee helposti. Hankkeen konkreettinen toteutuminen antaa uskoa alueen asukkaille omaehtoisen kehittämistyön mahdollisuuksiin.

2.3. Yhteistyökumppanit

Tämän hankkeen aikana syntyi Piippolan kirkonkylän kehittämiseen sitoutunut toimijajoukko, johon kuuluvat ainakin:

- Siikalatvan kunta
- Siikalatvan seurakunta
- Piippolan Iltavirkku ry.
- Piippolan kyläyhdistys
- Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto (JEDU)
- Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston oppilaskunta
- Urheiluseura Piippolan Terävä
- Haapa veden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
- Siikalatvan kulttuuri – Sikuri ry

2.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen toimenpiteiden (kohta 2.2.1.) pohjalta Piippolaan rakennettiin monipuolinen lähiliikuntapaikkakokonaisuus, joka palvelee kylän asukkaita erittäin monipuolisesti ja tarjoaa liikunta- ja luontoeelämyksiä myös vanhuksille, vammaisille, liikuntarajoitteisille ja kaikille erityisryhmille. Hankkeen tuloksena syntyi uudenlaista yhteistyötä eri tahojen kesken ja konkreettista näyttöä omaehtoisen kehittämistyön tuloksellisuudesta.

3. Allekirjoittajat ja päiväys

Siikalatva 12.3.2015

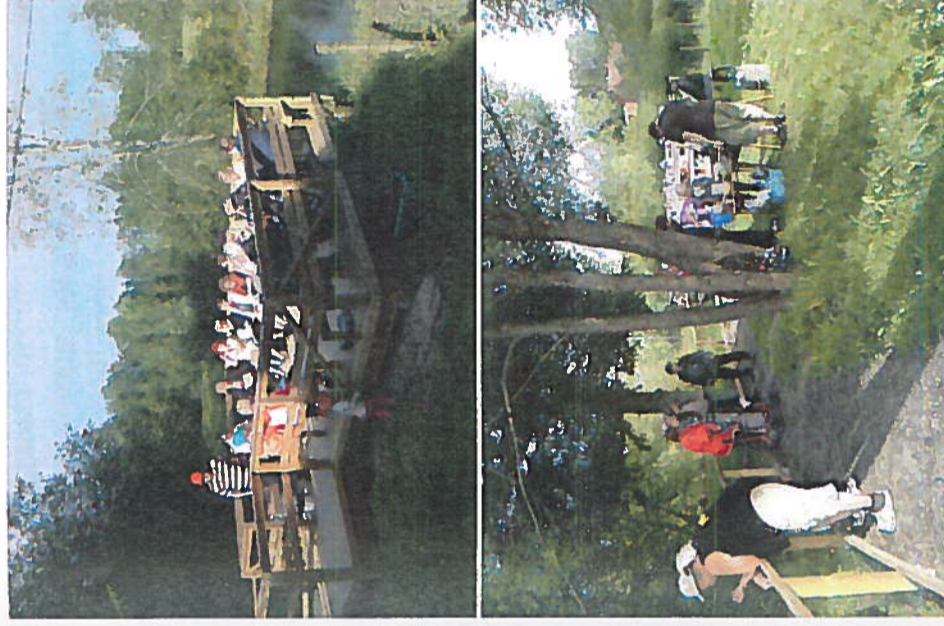

Hannu Saarinen, seutukuntajohtaja

Kesäilta Väinölässä
Rantaterassin avajaiset
ti 10.6. klo 18.00

**Haitarimusiikkia ja yhteislaulua
kesäisen Lamujen rannalla!**

Tarjoilla makkaraa, mehua ja muhavaa seuraa!
Huom! Sodahellilla hermostätkä!

Koti, Siiloatvorn Kulttuurit – Situnt ry & Iltavirkku ry



Kesäinen ilta Väinölan rantaterassilla osoitti sen, että piipposet kyllä laulaa, kun vaan annetaan mahdollisuus. *Hymiiö*
smile Sikurin ja Iltavirkkujen (ynnä tukena olleiden yhdistysten) järjestämässä illassa mukana mukava joukko monen sukupolven kyläläisiä ja vieraita naapurikyiltäkin. Soittomestarina Matti Ylikoski. Kiitokset kaikille osallisille! *Hymiiö*
smile

[Piipposet Facebook –sivu](#)

Lehdistötiedote 15.12.2014

PIIPPOLAN VIRKISTYSALUEIDEN KEHITTÄMISHANKE

Piippolan virkistysalueiden kehittämishanke on päättynyt. Hanke käynnistyi keväällä 2012 ja päättyi virallisesti 31.12.2014. Hankkeessa rakennettiin Piippolan keskustaan Pappilanniemeen luontopolku ja Väinölänrantaan aidattu laituri, jonne johtaa aidattu polku. Niin ikään rakennettiin lähiliikuntapaikka, jossa on golfin harjoituslyöntirata ja puttausgreeni, hiihtomaa, frisbeegolfin maalialue ja paikka jousiammunnalle.

Hanke sai alkunsa Piippolan kirkonkylän toimijoiden ja Keskipiste-Leaderin järjestämästä ideoinnista, jonka tuloksena syntyi hankesuunnitelma ja rahoitushakemus, joka sai myönteisen päätöksen keväällä 2012. Ideointiin osallistui suuri joukko piippolalaisia yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä. Hanketta hallinnoi Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä. Hanketta rahoitti Keskipiste-Leader ry.

Hankkeen aikana rakennetut vapaa-ajanvietto- ja liikuntapaikat ovat vapaasti kaikkien kyläläisten käytössä ja ne tuovat merkittävät lisän entisen kuntakeskuksen vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.

Lisätiedot: Hannu Saarinen hannu.saarinen@siikalatva.fi tai 0400-384 998



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa Investoi maaseutualueisiin
