

23.11.15 Po



Pyhännän matkailun kehittämisen investointihanke

Hankkeen toteuttaja:

Pyhännän kunta (y-tunnus 0189226-6)

Manuntie 2 92930 Pyhäntä

Hanke:

Pyhännän matkailun kehittämisen investoinnit.

Hanketunnus:

Dnro 364/3560-2011

Yhteenveto hankkeesta:

Hankeella parannetaan maaseutumatkailun toimintaedellytyksiä Pyhännällä.

Hankeella parannetaan myös vapaa-ajanreitistöjä ja virkistyspaikkoja. Hanke pitää sisällään latureittien ja kelkkaurien parantamista ja Ahvenjärven alueen luontopolun korjausta ja taulujen päivityksen. Iso-Lamujärven saariin 2 kpl tulee tulipaikat. Latureittien varrelle rakennetaan myös laavuja.

Hankkeen kokonaisuuden osalle tehdään koko Pyhäntää koskeva Pyhännän ulkoilu- ja retkeilykartta joka palvelee kuntalaisia ja kunnan ulkoilualueella ja reiteillä liikkuja. Kartasta tehdään myös nettiversio.

Hankeen tavoitteet:

Hankeen tavoitteena on parantaa kuntalaisten viihtyvyyttä ja lisätä ihmisten liikunta- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hankeella parannetaan myös matkailun toimintaedellytyksiä Pyhännällä.

Hankeen toteutus:

Tehtyjä toimenpiteitä ajalla 1.11.2011-31.12.2014

Latureittien– ja kelkkaurien pohjien parantamista: ✕

-Latureittipohjien tasausta

välillä Pyhäntä –Ahokylä(Ahvenjärvi)


22 km

välillä Pyhäntä-Tavastkenkä

7 km



Tasattu ja merkitty latupohja Pyhäntä-Tavastkenkä hiihtoreitillä.

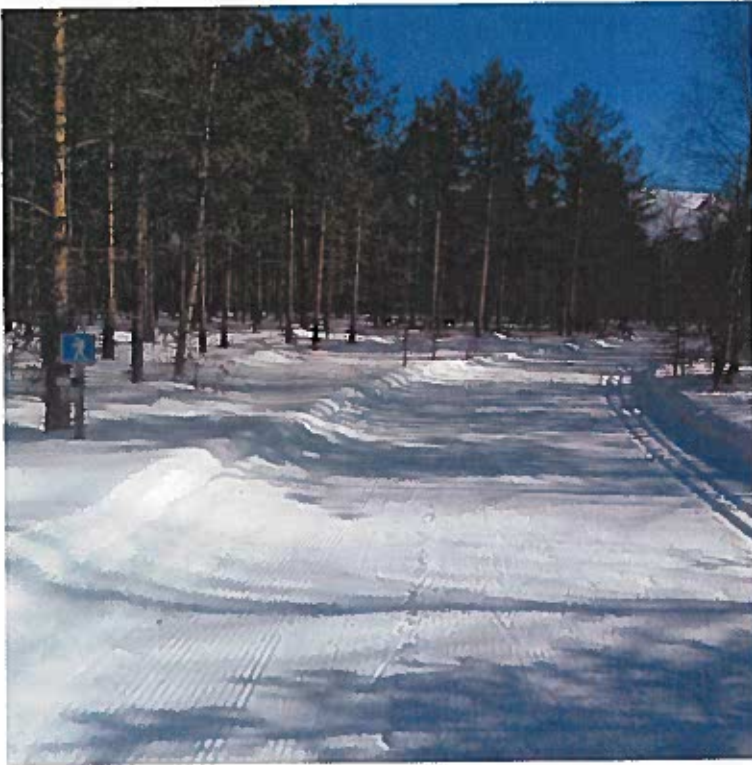

Tasattua ja merkittyä latupohjaa Pyhüntä-Iso-Ahvenjärven hiihtoreitillä.

Kelkkaurien pohjien tasausta <

välillä Pyhüntä-Ahvenjärvi (Ahvenjärvi)

22 km

välillä Pyhüntä-Sotasaaret-Iso-lamujärvi

7 km

välillä Iso-lamujärvi-Pyhäjärven raja

4 km



Kelkkauran silta Patasuolla Iso-lamujärvi-Pyhäjärvi reitillä.


Ahvenjärven alue:

- Hautalammin laavu rakennettu 1 kpl
- Ahvenjärven luontopolun pitkospuita uusittu 500 jm
- Jätehuoltokatos rakennettu 1 kpl
- Opastaulujen päivitetty 29 kpl.

(Työ tehnyt FM,TaM Eira Ainalinpää)



Uudet pitkospuut ja jätekatos Ahvenjärvellä.

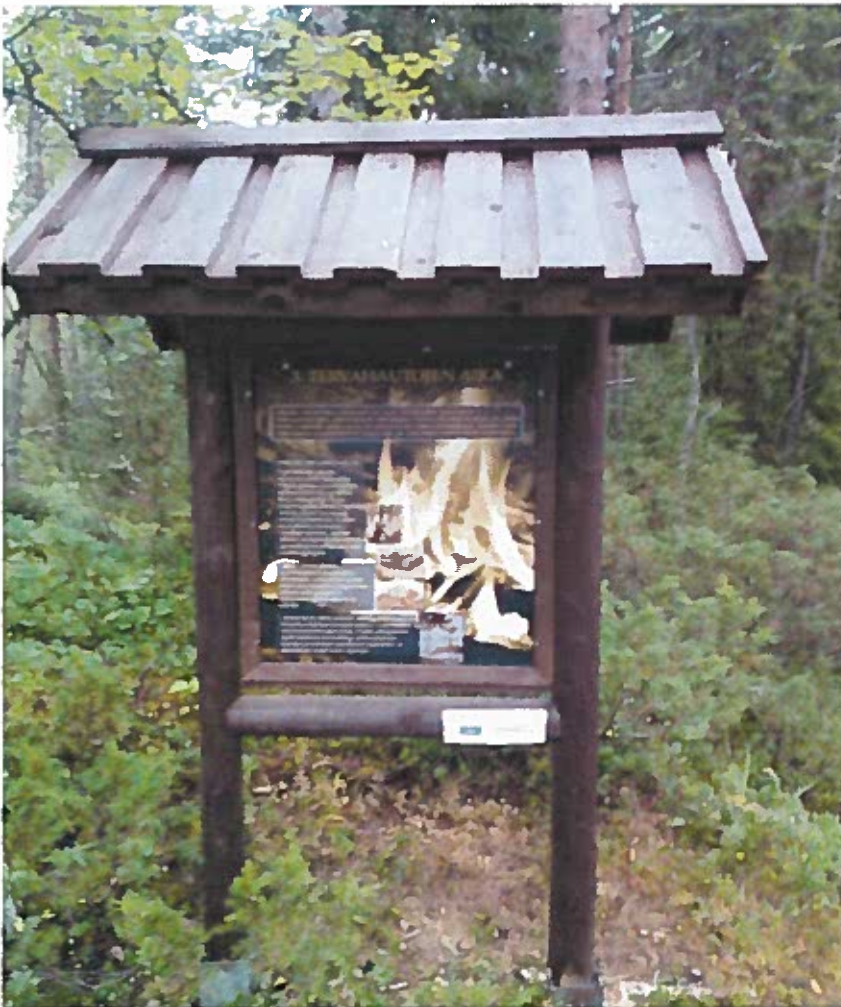

Opastaulu Ahvenjärvellä Kairanmaan kierroksella.

Iso-Lamujärven alue:

- Nuotiopaikkojen luvat haettu ja saatu Metsähallitukselta kahteen saareen Matinsaari ja Pitkäsaari
- Nuotiopaikat rakennettu Matinsaareen ja Pitkäsaareen 2 kpl (sisältää nuotiopaikan, kompostin, wc:n ja puukatoksen)
- Kamulankylän uimarannalle tehty halkovaja 1 kpl
- Museon uimarannalle rakennettu (muutos hyväksytetty Ely:ssä) puukatos ja wc-rakennus.
- Kaivo kunnostettu ja asennettu uusi Klassinen kaivopumppu.



Kunnostettu kaivo Iso-Ahvenjärvi.



Museon uimarannan uusi wc ja puuliiteri.

Huhmarpuron suun ruoppaus:

- Huhmarpuron ruoppauksesta tehty suunnitelma Maveplan Oy .Ruoppauslupa saatu Ely-keskukselta.

Ruoppautyöt saatettu loppuun 30.3.2013.



Venevylän ruoppauskuvia maaliskuulta 2013.

*R-alue + radan valaistus
linjauksen muutos jää pois.*

Reitistöt:

- Kelkkareittien merkintöjä uusittu ja tarkistettu ja parannettu 30 km
(välillä Pyhäntä-Ahokylä ja Pyhäntä-Iso-Lamujärvi ja osin Pyhäntä-Tavastkenkä)
- Hiihtoreittien merkintöjä parannettu välillä Pyhäntä-Ahokylä 22 km
- Tulipaikka + laavu rakennettu Pyhäntä –Tavastkenkä hiihtoreitin varrelle
Soitimenkankaalle 1 kpl
- Pyhännän retkeily – ja ulkoilukartasto valmistunut (tekijä Mapline Oy).
- Nettiversio toiminnassa.



Moottorikelkkauraa Ukonojan maastossa.

P-alueen rakentaminen :

-Rakennettiin 30x30 p-alue Kestiläntien varteen Ukonojan kuntoreitin alkuun. P-alue myös valaistiin. P-alue liitettiin Ukonojan retkeilyreitin valaistukseen. P-alueen rakentaminen ja valaistus tapahtui syksyllä 2014.

Yhteistyökumppanit:

- Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
- Siikalatvan kehittämiskeskus
- Metsähallitus

Käytetty henkilöstö/palveluja:

- Projektin vastaava/Timo Aitto-oja tekn.päällikkö
- Työnjohtajana ja valvojana 1.2-31.12.2012 rkm.Kari Körkkö
- Työntekijät:

- *Risto Korsulainen
- *Sami Kamula
- *Markku Arbelius
- *Taisto Rimpeläinen
- *Timo Tervola

-Muita palvelun tuottajia

- *Mapline oy/Ulkoilukartan laatija
- *Fm/TaM Eira Ainalinpää/Kairanmaan luontopolun uusien taulujen suunnittelija
- *Veneväylän ruoppaaja/Eero Remes Kiuruvesi
- *Maveplan Oy /Ruoppaussuunnitelmien laatija
- *Kuljetus Ensio Pääkkölä /kelkkaurien – ja latupohjien tasaukset
- *Suomen Turvakilvet Oy/reittimerkit
- *Jh-Konetyö Oy/Kuljetuksia
- *Avantouinti seura ry/varaston ,wc ja liiterin teko
- *Kantola Tuvat Oy/hirsikehikkojen toimituksia
- *Kuljetus Luttinen Oy

Hankeen kulut:

Hankeen kustannusarvio:

-Hankeen kokonaiskustannusarvio	147 000 e
-Elyn avustus 50%	73 500 e

Toteutuneet kustannukset:

-Vuosi 2011	5127,02 e
-Vuosi 2012	78 308,35 e
-Vuosi 2013	41 421,32 e
-Vuosi 2014	13 325,87 e
Toteutuneet kustannukset yhteensä	138 182,56 e

Allekirjoitus:

Pyhännällä 11.12.2014

**Timo Aitto-oja/Tekninen päällikkö
Pyhännän kunta
Tekninen lautakunta**
