

Pyhjärven kaupunki

Kärrynpyörä

INVESTOINTIOSA

1.6.2003 - 31.12.2005

LOPPURAPORTTI





SISÄLTÖ

1. HANKKEEN TAUSTATIEDOT

1.1. Hankkeen yhteystiedot

1.2. Hallinnoija ja
rahoittajat

1.3. Hankkeen
aikataulu

2. HANKKEEN TAUSTA

2.1.
Lähtötilanne

2.2. Tavoitteet

2.3.
Tulosodotukset

3. INVESTOINTIHANKEKOhteet

1. Emoniemi-Kirkonkylä
ry
2. Hietakylän kyläyhdistys
ry
3. Hiidenkylän kyläyhdistys
ry
4. Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry
5. Lamminahon Ahto
ry
6. Rannan Vire
ry
7. Vuolto-Niinimäen kyläyhdistys ry

4. RESURSSIEN KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET

5. ARVIO TULOSTEN TOTEUTUMISESTA

5.1.
Määrälliset

5.2.

Laadulliset

6. TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI JA TOIMINTOJEN JATKAMINEN

7. RAPORTIN HYVÄKSYMINEN JA OHJAUSRYHMÄN KOMMENTIT



Näkymä Vuohtomäeltä Kankimäen näköalatornista, korkeus yli 200 m merenpinnasta.

1. HANKKEEN TAUSTATIEDOT

1.1. Hankkeen yhteystiedot

Kärrynpyörä-investointiosa
Hankenumero: 12475
Diaarinumero: 1305/3524-2003

1.2. Hallinnoija ja rahoittajat

Hankkeen hallinnoija Pyhäjärven kaupunki. Hanke kuului osana Kärrynpyörä II-koulutusosio –hanketta ja näillä oli yhteinen ohjausryhmä.

Hanke on rahoitettu LEADER+ -yhteisöaloite –ohjelmasta.

1.3. Hankkeen aikataulu

1.6.2003 – 31.12.2005

Hankkeen toteutusaika 1.6.2003 – 31.10.2005, jatkoaika 31.12.2005 saakka.

2. HANKKEEN TAUSTA

2.1. Lähtötilanne

Väkipyrä-kehittämishankkeen aikana tuli esille kylillä olevia investointitarpeita, jotka koottiin yhteiseksi hankkeeksi. Pyhäjärviset kylät halusivat kehittää kyliänsä ja vaikuttaa niiden asuttuna pysymiseen, asumisen viihtyisyyteen ja lisätä kyliensä vetovoimaisuutta. Sosiaalinen hyvinvointi ja elämänlaadun parantaminen palvelee niin kyläläisiä kuin Pyhäjärvellä viihtyviä kesäasukkaita.

2.2. Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli parantaa kylillä asuvien eri-ikäisten asukkaiden elämisen laatua, juurruttaa kylältä lähteviä nuoria omaan kotiseutuun ja saada asukkaat pysymään kylällä. Samalla palvellaan kesäasukkaita ja edistetään elinkeinollisuutta pysyttämällä oman kyläkaupan omalla kylällä. Välillisesti vaikutetaan Pyhäjärven elinkeinoelämään. Hankkeella rakennetaan kylillä asuvien eri-ikäisten ihmisten sosiaalista vuorovaikutusta, yhteistyötä ja yhteishenkeä sekä oma-aloitteisuus kylän kehittämiseen lisääntyy.

2.3. Tulosodotukset

Tulosodotuksena hankkeella oli viihtyisät ja elinvoimaisemmat kylät. Yrittäjyyttä vahvistetaan, ihmisten elämisen laatua parannetaan ja matkailullisesti kesäasukkaat ja muut vieraat palvellaan paremmin. Hanke edistää alueen vetovoimaisuutta ja parantaa ympäristöä.

3. INVESTOINTIHANKEKOHTEET

Investointikohteille 3, 5 ja 7 hankittiin asianmukaiset tienvarsikyltit sekä alueiden hallinta/vastuutahoista ilmoittavat taulut kohteisiin 1, 2, 3 ja 6.

1. Emoniemi-Kirkonkylä ry

Emoniemi-Kirkonkylä –alueelle rakennettiin maitolaituripysäkit Kirkonkylälle ja Emoniemeen Sammallahden risteykseen, jotka ”vihittiin” kyläyhdistyksen pikkujouluissa 1.12.2005. Lisäksi Pappilanlahtea maisemoitiin jääneillä varoilla. Kohteisiin käytettiin hankkeen tarvikebudjetista 7,08 %.



Kirkonkylä



Sammallahti / Emoniemi



Pappilanlahti

2. Hietakylän kyläyhdistys ry

Hietakylälle rakennettiin kylälaisten yhteiseen rantaan uimakoppi/kuorikekämälä-rakennus ja uimakopin sisäseinään ilmoitustaulu. Lisäksi rannan välittömään läheisyyteen tehtiin tienviereen maitolava. Rannan avajaiset 25.9.2005. Kohteeseen käytettiin hankkeen tarvikebudjetista 3,27 %.



3. Hiidenkylän kyläyhdistys ry

Hiidenkylälle Tervapuron levähdysalueen yhteyteen rakennettiin leikkikumpare leikkivälineineen, riukuaita ja kuntopolku. Alue vihittiin Leikki-Hiitolaksi 21.8.2005. Kohteeseen käytettiin hankkeen tarvikebudjetista 3,28 %.



4. Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry


Jokikylälle rakennettiin silta valaistulle hiihtoladulle Pyhäjoen yli ja ilmoitustaulu Ruhkaperälle. Kohteisiin käytettiin hankkeen tarvikebudjetista 0,74 %.





5. Lamminahon Ahto ry

Lamminahon Honkavuorelle rakennettiin 12 metriä korkea luontotorni ja ulkokäymälä. Lisäksi tehtiin keloportti tervehtimään Hiisituvalle kääntyvää. Luontotorni vihittiin 7.7.2004. Kohteisiin käytettiin hankkeen tarvikebudjetista 10,02 %.

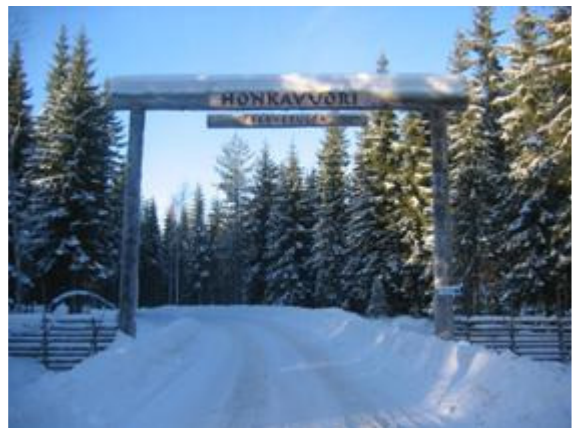

6. Rannan Vire ry

Rannankylän Vaivion ranta koki täydellisen muutoksen. Alueelle rakennettiin grillikota, puulato, ulkokäymälä, pukukopit, kiertotie rantaan, veneluiska, kivilaituri veneiden kiinnityspuomineen ja lisäksi ranta-alue maisemoitiin. Rannan vihkiäiset olivat 6.8.2005. Kohteeseen käytettiin hankkeen tarvikebudjetista 24,74 %.



7. Vuotto-Niinimäen kyläyhdistys ry

Vuotomäelle Kankimäen päälle rakennettiin 20 metriä korkea näköalatorni, grillikota ja ulkokäymälä. Kankimäen näköalatorni vihittiin 6.7.2005. Säästyneillä varoilla kunnostettiin Petäikkörannassa veneiden laskuluiskaa ja tehtiin pieni aallonmurtaja puulaiturineen. Kohteisiin käytettiin hankkeen tarvikebudjetista 50,87 %.



4. RESURSSIEN KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET

Rahoituksen toteutuminen

Rahoitus ja kustannukset ovat arvioina vuoden 2005 osalta.

RAHOITUS	Hyväksytty	v. 2003	v. 2004	v. 2005	YHTEENSÄ
TE-keskus, EU	33423	1 888,84	17 645,09	13 844,66	33 378,59
TE-keskus, valtio	20054	1 133,30	10 587,06	8 306,79	20 027,15
Kunta	13369	755,53	7 058,04	5 537,86	13 351,43
Julkinen rahoitus yhteensä	66846	3 777,67	35 290,19	27 689,31	66 757,17
Luontoissuoritukset, talkootyö	66846	3 777,67	35 290,19	27 689,31	66 757,17
Yksityinen rahoitus yhteensä	66846	3 777,67	35 290,19	27 689,31	66 757,17
Kokonaisrahoitus	133692	7 555,34	70 580,38	55 378,62	133 514,34

KUSTANNUKSET	Hyväksytty	v. 2003	v. 2004	v. 2005	YHTEENSÄ
Ostetut tarvikkeet	66 846	3 777,67	35 290,19	27 689,31	66 757,17
Luontoissuoritukset, talkootyö	66 846	9 508,50	31 416,00	25 832,67	66 757,17
Kokonaiskustannukset	133692	13 286,17	66 706,19	53 521,98	133 514,34

5. ARVIO TULOSTEN TOTEUTUMISESTA

5.1. Määrälliset

	Tavoite	Toteutunut
▪ Investointihankekohteet	7	7
▪ Uudistetut (säilytetyt) työpaikat	2	-
- miehet, kpl	1	-
- naiset, kpl	1	-
▪ Hankkeen aikana työllistyvät, yht.	2	35
- miehet, kpl	-	35
- naiset, kpl	2	-
→ joista alle 30 v.	-	2
▪ Tiedotus- ja aktivointitilaisuuksien määrä, kpl	-	6
- osallistujista miehiä	-	173

- osallistujista naisia	-	190
- osallistujia yhteensä	-	363
→ joista alle 30 v.	-	93

- Lehtijuttuja hankkeesta paikallis- ja aluelehdissä ja niiden nettilehdissä yhteensä 21 kpl.

5.2. Laadulliset

Hanke on profiloitunut yhteistyötä kylillä, lisännyt yhteistyöhalukkuutta ja kasvattanut itsearvostusta oman kylän vahvuuksiin.

Hankkeella parannettiin kylien julkisuuskuvaa ja palautettiin perinnettä, mm. maitolaituripysäkkien avulla.

Eri kylien yhteiset alueet saivat positiivisen muodonmuutoksen.

6. TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI JA TOIMINTOJEN JATKAMINEN

Investointikohteiden tekeminen lisäsi kyläläisten yhteistyötä. Yhdessä tekeminen ja ”yhteen hiileen puhaltaminen” lujitti yhteishenkeä. Talkoita kertyi huomattavasti yli tarpeen.

Kohteet ovat viihtyisiä kokoontumispaikkoja niin oma- kuin vieraskyläläisille. Järvellä liikkuvien asukkaiden, matkailijoiden ja kesäasukkaiden palveluvarustetaso on parantunut.

Rakennetuissa kohteissa voidaan tarjota niin ryhmille kuin yksittäisille käyttäjille toimivia palveluita. Kohteet kiinnostavat myös ulkolaisia kävijöitä.

7. RAPORTIN HYVÄKSYMINEEN JA OHJAUSRYHMÄN KOMMENTIT

Hanke on päätynyt 31.12.2005. Ohjausryhmä totesi yksimielisesti, että hankkeelle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet toteutuivat yli odotusten. Hyväksytyn kustannusarvion puitteissa kylille tärkeitä investointikohteita voitiin toteuttaa suunniteltua enemmän ohjausryhmän sekä rahoittajan päätösten mukaisesti.

Loppuraportti hyväksytty 16.2.2006 ohjausryhmän kokouksessa.
