



KYLÄVALAKIAT

Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueet



Loppuraportti
Marraskuu 2004

ALMA (Emotr-t)

Hankkeen numero : 2880
Hankkeen diaarinumero: 2579/351 – 2001



Sisällysluettelo

Tiivistelmä	3
Johdanto	4
Projektiorganisaatio	5
Kylävalakiat hankesuunnitelman valossa	6
Kuinka hankesuunnitelma onnistui?	7
Kuinka päästiin tuloksiin eli toimenpiteet	9
Koulutus	9
Kyläsuunnitelmat	10
Muita toimenpiteitä	12
Hankkeen tulokset	12
Lukumääräiset tulostavoitteet ja saavutetut tulokset	12
Kylien suunnitelma- ja koulutustilanne	12
Hankkeen arvioituja vaikutuksia	14
Kylien www-sivustot ja portaali	14
Julkisuus ja tiedottaminen	16
Suunnitelmat	16
Tuotokset	16
Yhteistyö muiden tahojen kanssa	17
Projektin kustannukset ja rahoitus	19
Hyväksytty julkinen rahoitus	20
Hyväksytty yksityinen rahoitus	18
Hankkeen synnyttämät jatkotoimenpiteet	19
Kuvia matkan varrelta	20
Liitteet	22

Tiivistelmä

Marraskuussa 2001 käynnistynyt ja marraskuussa 2004 päätynyt Kylävalakiat –hanke on yksi Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelman maakunnallisista kärkihankkeista. Hanke syntyi edistämään erityisesti kylätoiminnan suunnitelmallisuutta kylä-, kunta- ja maakuntatasolla.

Hankkeen toteutusalueena oli Alma-alue Pohjois-Pohjanmaalla — siihen kuuluvat Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat.

Kolmivuotinen hanke toteutettiin laajana yhteistyöhankkeena eri oppilaitosten, Pohjois-Pohjanmaan Liiton, TE-keskuksen, seutukuntien ja kuntien kesken. Hankkeen päähallinnoijana oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskus, joka myös toteutti toimenpiteitä Oulun ja Raahen seutukuntien alueilla. Toteuttamisen osalta yhteistyökumppanina oli Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus vastuualueenaan Ylivieskan seutukunta.

Tuloksien saamiseksi hanke käytti työkaluinaan useita erilaisia kursseja sisältävää koulutustarjotinta sekä ohjausta, neuvontaa ja kouluttamista kyläsuunnitelman tekoon.

Tulosten aikaansaamiseen vaikutti olennaisesti kyliensä kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten uuttera talkootyöpanos.

Koulutustarjotin sisälsi aihepiireiltään ympäristöosaamista, tietotekniikkaa ja liiketaloutta. Mukana oli myös muuta koulutusta kuten erilaisia seminaareja.

Hanke edisti ohjaamalla, neuvomalla ja kouluttamalla kylätoiminnasta kiinnostuneita kyläläisiä kyläsuunnitelmien ja kylätietokansioiden tekoon.

Kylävalakian toiminnassa oli mukana 71 kylää Oulun, Raahen ja Ylivieskan alueilta. Kyläsuunnitelmia, kylätietokansioita, hankesuunnitelmia ja muita kehittämissuunnitelmia kylissä saatiin aikaan 55 kappaletta. Kymmenen kyläsuunnitelmaa on päivitettävänä tai tekeillä tämän raportin kirjoitushetkellä. Hanke on työllistänyt 5 henkilötyövuotta ja talkootyötä on tehty 5239 tuntia. Koulutusta kertyi 2926 oppilastyöpäivää. Hankkeen aikaansaamien yritysten ja vaikutuksen työllistyvyyteen näkee vasta tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana valmistettiin www.ppkylat-kylaportaali yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kanssa. Sivusto sisältää mm. jatkuvasti päivitettävän kylätietokannan ja linkkiluettelon kylien omille kotisivuille.

Tiedottaminen hankkeen sisällä kuin myös ulospäin oli aktiivista. Kylävalakiat oli niin lehdistön kuin radioiden otsikoissa.

Hankkeen hyväksytyt kokonaisrahoitus oli 364 210,94 euroa. Julkisen rahoituksen osuus oli 89,29%. Siitä EU:n Alma-ohjelman (EMOTR-t) rahoitusosuus on 30,00%, valtion 60,18% ja kuntien 9,83%. Yksityinen rahoitusosuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 10,71%. ◀

Johdanto

Pohjois-Pohjanmaalle syntyi ensimmäisellä ohjelmakaudella maakunnallinen kylien koordinaatiojärjestelmä, jonka vastuutahona on Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Sen tuloksia ovat ns. maakunnalliset kärkihankkeet, joista ***Kylävalakiat –hanke*** on yksi. Nämä maakunnalliset kärkihankkeet pohjautuvat kyläohjelmaan ja tuovat uusia osajia mukaan kylien kehittämiseen ja täydentävät kehittämissyhdistysten toimintaa.

Ensimmäisellä ohjelmakaudella kärkihankkeille määriteltiin neljä kehittämissektoria, joita olivat suunnitelmallisuuden ja ansaintamahdollisuuksien lisääminen, palveluiden säilyttäminen ja viihtyisyyden lisääminen kylillä.

Kylävalakiat –hanke syntyi edistämään erityisesti kylätoiminnan suunnitelmallisuutta sekä kylissä että myös kunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Hankkeella on voitu vaikuttaa myös muiden kehittämissuhteiden parantamiseen.

Kylävalakiat –hankkeen vahvuuksia on ollut se, että jokainen kylä, joka on halunnut mukaan, on päässyt mukaan. Myös yhteistyö kylien kesken sekä eri toimijoiden kuten esim. kehittämissyhdistysten ja muiden hankkeiden kanssa on ollut erityisen hyvään. Verkostoituminen onkin ollut yksi hankkeen vahvuuksista. Väliarvioinnissa (elokuu 2004) todettiin, että verkostoitumisessa on päästy jopa parempiin tuloksiin kuin alunperin osattiin odottaa.

Toiminnallisella tasolla on pyritty siihen, että alueella toimivat asiantuntijat ovat hoitaneet käytännön toimenpiteiden toteuttamisen. Ylivieskan seutukunnassa toiminnallinen vastuu on ollut Kalajokilaakson aikuiskoulutuskeskuksella. Oulun ja Raahen seutukunnissa Pohjois-Suomen Koulutuskeskus on vastannut käytännön toteutuksesta. Hankkeessa on voitu hyödyntää monella tapaa oppilaitosten omaa asiantuntijuutta mm. koulutuksen ja ohjauksen järjestämisessä. Oppilaitoksille hanke on myös tarjonnut mahdollisuuden edistää työelämälähtöisen koulutuksen järjestämistä. ◀

Projektiorganisaatio

Kylävalakiat-hanke toteutettiin Pohjois-Suomen Koulutuskeskuksen ja Kalajokilaakson ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen välisenä yhteistyönä. Pohjois-Suomen Koulutuskeskus hallinnoi hanketta ja hankkeen vastuullisena johtajana on toiminut rehtori Jaakko Tarakkamäki.

Hankkeen toteutusalueena oli Alma-alue Pohjois-Pohjanmaalla. Siihen kuuluvat Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat. Työnjako sovittiin toteuttamisen osalta siten, että Ylivieskan seutukunnassa hankkeen toimenpiteitä toteutti Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus oman ohjelman ja budjetin puitteissa sekä Oulun ja Raahen seutukunnassa toimintaa toteutti Pohjois-Suomen Koulutuskeskus.

Projektin ohjausryhmässä olivat mukana:

Kaisa Uusioja, Pohjois-Pohjanmaan Liitto, puheenjohtaja
Minna Kyllönen, TE-keskus, hankkeen valvoja
Leena Isopahkala, Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Pekka Salonsaari, Rieska-Leader, Ylivieska
Kaisu Tuomi, Siikajoen kunta
Pirjo Hongisto, Nouseva rannikkoseutu ry.
Maija Isokääntä, kylien edustaja
Tarja Wörlin, kylien edustaja
Jaakko Tarakkamäki, Pohjois-Suomen Koulutuskeskus
Tarja Niskanen, Pohjois-Suomen Koulutuskeskus, sihteeri

Hanketoimistot:

Pohjois-Suomen Koulutuskeskus, Kansankatu 47 B, 90140 Oulu.
Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Opintie 2, 85100 Kalajoki.

Hankkeen henkilöstö Pohjois-Suomen Koulutuskeskuksessa:

Projektipäällikkö Tarja Niskanen 1.11.2001-30.11.2004.
Projektisihteeri Marja-Liisa Junes 1.8.2002-30.11.2004.

Hankkeen henkilöstö Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskuksessa:

Hankevetäjä Leena Isopahkala 1.11.2001-30.11.2004.

Ostopalveluna ja osittain tuntityönä kyläsuunnittelija Outi Levä 1.12.2001-30.9.2004. ◀

Kylävalakiat hankesuunnitelman valossa

Kylävalakiat oli Ylivieskan, Raahen ja Oulun seutukuntien kylien kehittämishanke, joka oli tarkoitettu kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien ym. aktiivisille henkilöille ja toimijoille.

Hankkeen tavoitteina olivat

- Kylien hyvinvoinnin lisääminen
- Elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittäminen
- Kunnallisten päätösten ja kylien välisten raja-aitojen kaataminen
- Laajan yhteishankkeen avulla kohottaa kehittämistyön merkitystä ja yhteistoimintaa
- Saavuttaa ja hankkia sellaista tietoa, osaamista ja yhteyksiä, joita tarvitaan kylien monimuotoisten toimintojen kehittämässä
- Oppia toinen toisilta ja yrittää yhdessä

Hankkeen aikana ajatuksena oli tarjota koulutustarjottimelta erilaisia aiheita, joista jokainen kylä ja kunta voi valita omansa. Lisäksi tarkoituksena oli antaa tarpeen mukaan kyläkohtaista ohjausta ja neuvontaa. Päämääränä oli hakea seutukuntien alueelta hankkeeseen mukaan vähintään 50 kylää, joille laaditaan kyläsuunnitelmat. Hankkeen kuluessa tarkoitus oli laatia kyläkohtainen tietokansio, johon kootaan keskitetysti saatu tieto ja koettu tieto. Kylien tarpeet ja mahdollisuudet oli tarkoitus kartoittaa ja kehittää niitä kylähankkeiksi asti. Tavoitteena oli tukea ja kylien www-sivujen teknistä ja sisällöllistä toteuttamista.

Hankkeen tuloksena syntyisi yhteensä vähintään 50 kyläsuunnitelmaa, kylätietokansiota ja kyliin liittyvää hanketta. Uusia kyläyrityksiä syntyisi kuusi kappaletta ja uusia työpaikkoja 10 kappaletta. Muuten hankkeen aikana työllistyisi 20 henkilöä, säilytettyjä työpaikkoja olisi 100 kappaletta, talkootyötä noin 3000 tuntia (375 työpäivää) sekä koulutusta kertyisi yhteensä 2400 oppilastyöpäivää.

Kolmivuotinen hanke (*taulukko 1*) toteutettiin laajana yhteistyöhank-

Taulukko1. Hankesuunnitelman mukainen aikataulus:

11/2001	Projektin käynnistäminen, tiedottaminen, kylien aktivointi ja valinta, www-sivujen laatiminen ja kytkeminen portaaleihin
11/2001	Kyläsuunnitelmien laatiminen käynnistyy, koulutuspäivät, yleissemi-naarit
1/2002	Ensimmäinen Kyläkehittäjä-koulutusohjelma käynnistyy (10-20 henkilöä, kesto 4 ov), PSK
1/2003	Toinen Kyläkehittäjä-koulutusohjelma käynnistyy (10-20 henkilöä, kesto 4 ov), PSK
1/2002 – 8/2004	Kyläsuunnitelmien ohjattu laatiminen/hankkeistus, kyläkoulutus
30.11. 2004	Projektin päättäminen, tilintarkastus, evaluointi, tiedotus. Alunperin projektin piti loppua 9/2004, mutta rahoittajan päätöksellä projektin kestoja jatkettiin kahdella kuukaudella 30.11. 2004 saakka.

keena eri oppilaitosten, Pohjois-Pohjanmaan Liiton, TE-keskuksen, seutukuntien ja kuntien kesken.

Kuinka hankesuunnitelma onnistui?

Hankkeen oli aivan alkujaan tavoitteena käynnistyä elokuussa 2001, mutta aikataulutusta tarkistettiin kun saatiin rahoittajalta tieto myönteisestä päätöksestä. Hanke käynnistyi päivitetyn suunnitelman mukaisesti marraskuussa 2001. Alussa järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja markkinoitiin hanketta. Kyliä ilmoittautuikin mukaan suuri joukko jo heti keväällä 2002.

Ylivieskan seutukunnassa kylien osallistuminen hankkeeseen oli helppoa, sillä Ylivieskan seutukunta osallistui hankkeen kuntarahoitusosuuden maksamiseen. Kylien eikä hankevetäjän tarvinnut huolehtia kuntarahoitusosuudesta, vaan kylät saattoivat osallistua hankkeeseen hyvin joustavasti. Oulun ja Raahen seutukunnissa toimijat jouduttiin hakemaan mukaan kylä kerrallaan. Tämä tarkoitti sitä, että kun kylä ilmaisi halukkuutensa osallistua hankkeeseen, haettiin erillinen päätös kuntien sitoutumisesta kuntarahoitukseen. Onneksi joissakin kunnissa tehtiin päätös siitä, että jokainen kylä, joka haluaa osallistua, voi sen tehdä. Tämä toimintamalli kuitenkin lisäsi hallinnollisia tehtäviä. Näin laajoissa hankkeissa, joissa toimijoita on paljon, on varmasti järkevää osallistua hankkeen rahoitukseen seutukuntana.

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa esitettyjen yritysten syntymiseen, työpaikkojen syntymiseen ja säilymiseen liittyvien määrällisten tavoitteiden toteutumista on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida — nämä tulokset näkyvät vasta tulevaisuudessa.

Käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa on päästiin asetettuihin

tavoitteisiin, ja joitakin jopa ylitettiin. Alla on kuvattu Kylävalakiat –hankkeen toteutumista väliarvioinnin pohjalta. Arviointi toteutettiin toukokuun 2004 – elokuun 2004 välisenä aikana 21 valitulle kohdekyllälle lähetetyllä sähköposti-/kirjekyselyllä, joihin vastauksia saatiin 19, sekä 25 kuntien virkamiehille ja muille yhteistyötahoille tehdyillä puhelinhaastatteluilla. (*Lähde: Hakkarainen, Kirsi. Kylävalakiat –hankkeen Alma osion väliarviointi. Pohjois-Suomen Koulutuskeskus 13.8.2004.*)

Kesään 2004 mennessä yli puolessa vastanneista kylistä oli tehty tai päivitetty kyläsuunnitelma Kylävalakiat –hankkeen aikana. Väliarvioinnin jälkeen on valmistunut useita kyläsuunnitelmia. Kyläsuunnitelmien tekeminen on aktivoinut kyläläisiä ja antanut mahdollisuuden tutustua oman kylän historiaan ja asukkaisiin. Vastausten perusteella ohjausta on saatu hyvin, mutta yhteistyötä kunnan kanssa voitaisiin lisätä suunnitelman teossa. Suurimpana ongelmana useimmilla kylillä oli aktiivisten suunnitelman tekijöiden vähäinen määrä, jolloin vastuu teosta jäi vain muutamien ihmisten harteille.

Vastausten mukaan noin puolella kylistä on syntynyt uutta elinkeinopohjaista toimintaa viimeisen kahden vuoden aikana ja hieman alle puolessa kylistä on kyläsuunnitelmaan kirjattuna elinkeinotoimintaan liittyviä tavoitteita. Yli puolessa kylistä on kyläsuunnitelman laatiminen auttanut hankkeiden toteutumista. Kylävalakiat –hanke on myös tukenut tai edistänyt hankkeita.

Edelleen väliarvioinnin mukaan tiedotus Kylävalakiat –hankkeesta on kylien mielestä toteutunut parhaiten kylän sisällä. Myös tiedottaminen kylien ja hankkeen toteuttajatahon välillä on onnistunut hyvin. Eniten parannettavaa on kylien ja kunnan välisessä tiedottamisessa. Yli puolella kylistä on kunnan luottamus- tai virkamiehiä osallistunut kyläsuunnitelman laatimiseen asiantuntija-apua antaen tai osallistuen suunnitelman luovutustilaisuuteen. Hanke on edistänyt kylien keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden kylien kanssa. Verkostoitumisesta on ollut apua myös oman kyläsuunnitelman teossa ja hankkeiden toteuttamisessa.

Yhteistyö kylien ja kuntakeskusten välillä on lisääntynyt suurimmasa osassa kunnista, mutta toisaalta hankkeiden runsaus on joillakin kylillä aiheuttanut hankeväsymystä, joka näkyy osaltaan vuorovaikutuksen laantumisenä. Väliarvioinnissa muutaman virkamiehen mielestä hankkeella on ollut yhteistyötä aktivoivia vaikutuksia.

Kylävalakiat –hankkeen näkyviä saavutuksia ovat olleet hankkeiden lisääntyminen tehtyjen kyläsuunnitelmien ansiosta, sekä kylien aktivoituminen ja verkostoituminen. Hankkeen parhaimpina puolina on pidetty käytännönläheisyyttä, konkreettisia toimenpiteitä ja kyläläisten omaa aktiivisuutta kyläsuunnitelmien teossa.

Väliarvioinnin mukaan kyläsuunnitelmat tuovat lisäarvoa kunnille,

mutta myös kyläsuunnitelman tekemiseen liittyvää prosessia pidettiin tärkeänä, koska se aktivoi kyläläisiä. Osassa kuntia oltaisiin valmiita ottamaan kyläsuunnitelmissa esiintyviä hankeideoita osaksi kuntasuunnitelmaa ja joissakin kunnissa näin on jo tehty. Kunnat toivoivat kylien ottavan tehdyt kyläsuunnitelmat täysimittaisesti käyttöön hankkeistamalla suunnitelmissa esiintyviä hankeideoita.

Kehittämisyhdistyksissä mainittiin Kylävalakiat –hankkeen parhaina puolina kehittämisyhdistyksiin tulevat hankkeet, eteenpäin lähtenyt kehittämistyö ja kyläsuunnitelmat. Hanketta kiiteltiin sen konkreettisista ja käytännönläheisistä toimenpiteistä, esimerkiksi hankehakemusten laatimisen auttamisesta. Kylävalakiat –hankkeella on kehittämisyhdistysten mukaan ollut selvästi kyliä aktivoivia vaikutuksia. Kehittämisyhdistysten toimijoiden mukaan suurin puute oli hankkeen henkilökunnan vähäinen määrä suhteessa alueen kokoon. Kylien taito hyödyntää tehtyjä suunnitelmia vaihtelee kehittämisyhdistysten mukaan paljon kylittäin. Toisaalta suunnitelmallisen toiminnan vaikutukset näkyvät monesti vasta myöhemmin. ◀

Kuinka päästiin tuloksiin eli toimenpiteet

Tuloksien saamiseksi työkaluina käytettiin useita erilaisia kursseja sisältävää koulutustarjotinta sekä ohjausta, neuvontaa ja kouluttamista kyläsuunnitelman tekoon.

Koulutus

Hankkeen aikana tarjottiin koulutustarjottimelta erilaisia aiheita, joista jokainen kylä sai valita haluamansa (*taulukko 2*). Tarjottimeen sisältyi myös kyläkohtaista ohjausta ja neuvontaa.

Kyläsuunnitelmat


Kyläsuunnitelmien tekoa katalysoitiin ohjaamalla, neuvomalla ja kouluttamalla kylätoiminnasta kiinnostuneita kyläläisiä. Ohjaaminen tapahtui lähiohjauksena paikan päällä kylässä ja myös etäohjauksena sähköpostitse.

Kyläsuunnitelman teossa lähdettiin oheisen kuvan mukaisesti (*kuvaa 1*) liikkeelle kyläselvityksestä, joka kertoo kylän sijainnista, maisemasta, historiasta, tilastotietoja ja kuvausta kylän nykyisestä tilanteesta. Selvityksessä saatuja tietoja voidaan hyödyntää useaan tarkoitukseen mm. kyläkirjaan ja www-sivuille.

Kyläselvityksen jälkeen kyläläiset koottiin avoimeen tilaisuuteen, jos-

Taulukko 2. Koulutustarjottimen anti.

Ympäristöosaamiskoulutus	Lumelveisto, Lumen- ja jäänveistokoulutus.
Tietotekniikka/Atk-koulutus/www	ATK:n perusteet, ATK-valmennus, Dokumentointikoulutus, WWW -sivukoulutus, WWW -sivujenpäivitys, Kyläseminaari, WWW-valmennus, ATK, ATK-etätyöt, Tietokone tutuksi ja avuksi, ATK-koulutus.
Liiketaloudellinen koulutus	Pohjoisen kylätaloutta-seminaari Saariselällä, Kirjanpito, Varainhankinta, Kylämarkkinointi, Maaseudun kehittäjän valmistava koulutus, Hygieniaosaaminen, Kirjanpitokoulutus, Opintomatka Osaava Nainen-messuille, Kyläsuunnitelma, Esiintymistaito, Yhdistyksen rekisteröinti, Esiintymiskarismaa, Tiedotuskoulutus, Kustannuslaskenta, Taloustietoa, Kirjanpitokäytäntö, Järjestökurssi, Vapaaehtois- ja ystävätoiminnan peruskurssi.
Muu koulutus	Kyläfoorumi I: Mille alettais-seminaari, Kevätretki, Kyläpäivät (Kuusamo, Utajärvi, Ylivieska), Opintomatka Sallaan ja Kuusamoon, Kylävalakiat hanketiedotus, Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Opintomatka Kierikkiin, Tulevaisuusverstaas, Pajutyökoulutus, Opintomatka vuoden 2001 kylään Sydänmaalle, Www-parkki, Kunta-kylät yhteistoiminta, Kangoksen opintomatka, Erilainen koulu-seminaari, Kolmen kylän kierros, Kyläkipinät-seminaari, Kylätyö-seminaari, Opintomatka Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistykseen.

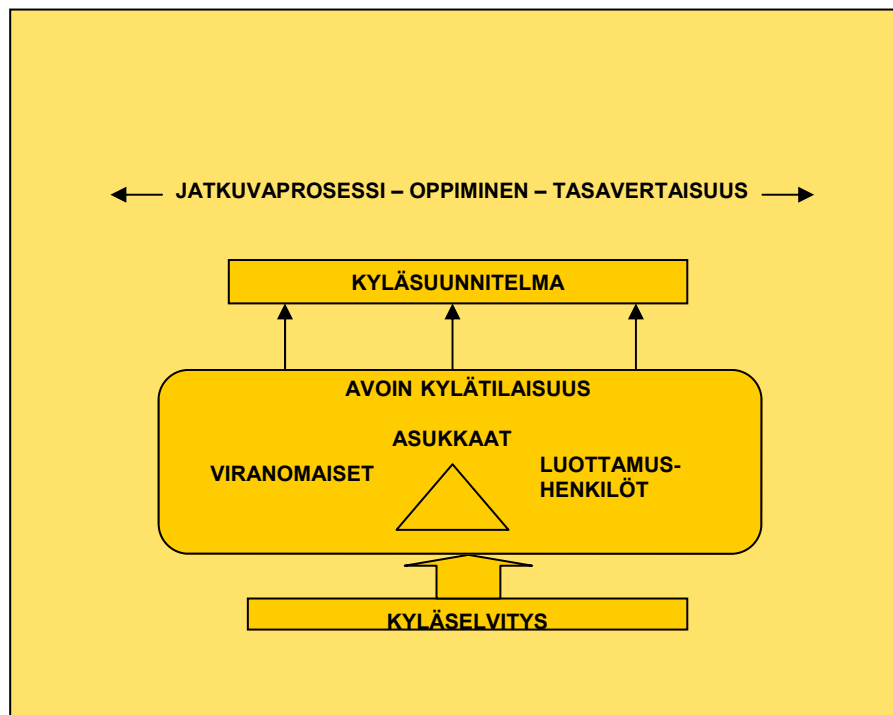

Kuva 1. Kyläselvityksestä hankeideoihin. Kyläselvityksestä edettiin kylätilaisuuksiin, joissa sovittiin tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut. Sitten eri tahojen keskinäisen vuoropuhelun kautta edettiin konkreettisiin kylähankkeisiin.

sa kyläsuunnitelmaa työstettiin yhdessä ja päätettiin kehitettävät asiat. Mukaan kutsuttiin myös kunnan virka- ja luottamushenkilöitä. Tarvittaessa perustettiin teemaryhmiä työstämään asioita eteenpäin.

Kyläsuunnitelman tavoitteita oli monentasoisia: kehitetään kylän omaa toimintaa, edistetään hankkeita, joihin vaikuttaa viranomaistoiminta tai tehdään hyvistä ideoista hankkeita, joille haetaan ulkopuolinen rahoitus (kuva 2).

Lopulta asiat summattiin yhteen yhtenäiseksi kyläsuunnitelmaksi (taulukko 3).

Kyläsuunnitelma sijoitettiin kylätietokansioon, joka sisältää suunnitelman lisäksi kylään ja sen kehittämiseen liittyvää tietoa.

Kylien tarpeet ja mahdollisuudet kartoitettiin ja kehitettiin niitä kylähankkeiksi asti – toimenpiteinä olivat kouluttaminen, neuvonta ja ohjaaminen.



Kuva 2. Kyläsuunnitelmat sisältävät kuvassa esitetyt kolmen tasoiset tavoitteet.

Taulukko 3. Esimerkki kyläsuunnitelman sisällöstä.

Tausta:	Miksi suunnitelma on tehty, ketä on ollut mukana ja miten on tehty.
Historiaa:	Millainen kylä on ollut ja mitä huomionarvoista kylän historiaan liittyy. Kylän vahvuuksia nimenomaan menneisyydestä.
Nykytilan kuvaus:	Kylän väestö ja asuminen, elinkeinot, palvelut, yhdyskuntateknikka, ympäristö, yhteistoiminta, arvot yms.
Tulevaisuus:	Millaiseksi kylän tulevaisuus ennakoidaan ja ennenkaikkea halutaan (visio, päämäärä).
Tavoitteet:	Tavoitteiden määrittely esim. nykytilan kartoituksen pohjalta.
Toimenpiteet:	Kerrotaan mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, ja jos tiedetään miten ja millä aikataululla, niin aina parempi.
Seuranta:	Kerrotaan miten suunnitelman toteuttamisen seuranta on sovittu. Seurannan kirjaaminen vahvistaa sitoutumista kehittämiseen ja samalla edesauttaa myös suunnitelman toteuttamista ja korjaamista tarvittaessa.

Muita toimenpiteitä

Muita toimenpiteitä olivat Kyläpäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen (Kalajoki, Utajärvi, Ylivieska). Kylälaulukilpailu (Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus), Kyläkehukilpailu (Pohjois-Suomen Koulutuskeskus) ja Kylälogokilpailu (Pohjois-Suomen Koulutuskeskus).

Messut: osallistuttiin Vanhanajan joulutapahtumaan sekä Elon voimaa –messuille.

Kylät-kaupunki -vuorovaikutuksen edistäminen: käynnistettiin yhteistyötä kylien ja Peltolan asukastuvan välillä.

Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus toteutti syksyllä 2002 kylälogokilpailun kyläyhdistyksille ja ja –toimikunnille yhteistyössä Oulun Eteläinen-lehden kanssa. Alueina olivat Ylivieskan seutukunnan ja Nivala-Haapajärven seutukunnan alueet. Tarkoituksena oli nostaa kylämarkkinointia, -identiteettiä ja –imagoa. Kilpailuun osallistui 30 kylää, joista palkittiin Alavieskan Kähtävän, Oulaisten Piipsjärven, Haapajärven Kuusaan kylät. Kunniamaininnan saivat Tyngän ja Vasankarin kylät Kalajoelta. Logokilpailu oli erittäin näkyvä ja innostava. ◀

Hankkeen tulokset

Lukumääräiset tulostavoitteet ja saavutetut tulokset

Taulukon 4 ja liitteen 1 kartan mukaisesti hankkeen toimintaan saatiin mukaan kaikkiaan 71 kylää. Tavoite ylitettiin 21 kylällä.

Hankkeessa saavutettiin yhteensä 55 kyläsuunnitelmaa, kylätietokansiota, hankesuunnitelmaa ja muita kehittämissuunnitelmia. Tavoitelukumäärä ylittyi viidellä. Lisäksi kymmenellä kylällä oli kyläsuunnitelmia tekeillä tai päivitettävänä raportin kirjoitushetkellä.

Talkootyötuntien määrä ylittyi 2239 tunnilla.

Tavoitteeksi asetettu oppilastyöpäivien määrä ylittyi 526 päivällä.

Kyliä suunnitelma- ja koulutustilanne

1.10. 2004 mennessä hankkeen toiminnassa on ollut mukana kaikkiaan 71 kylää. 30 kylässä kyläsuunnitelma saatiin valmiiksi, kymmenessä kylässä kyläsuunnitelma oli tekeillä tai vanha päivityksessä. 25 kylässä oli tehty hankesuunnitelmia Kylävalakiat-hankkeen puitteissa. Liitteenä taulukko Kyläsuunnitelma-, hankesuunnitelma- ja koulutustilanne kylittäin 1.10. 2004 (*liite 2*).

1.10. 2004 mennessä 24 kylää on osallistunut tietotekniikka/ATK/

www-koulutukseen, viisi kylää ympäristöosaamiskoulutukseen, 39 kylää liiketaloudelliseen koulutukseen, 53 kylää osallistui muuhun koulutukseen (esim. seminaarit) ja seitsemän kylää oli saanut muuta ohjausta (esim. rekisteröityminen).

Järjestettyjen koulutusten oppilastyöpäivämäärien (taulukko 5) suhteen naiset olivat miehiä ahkerampia: 2926 oppilastyöpäivästä 66,8 % oli naisten ja loput kolmannes miesten. Oppilastyöpäivämäärissä mitattuna koulutuksista suosituimpia olivat tietotekniikka /ATK/www – koulutus (37,6 %) ja liiketaloudellinen koulutus (32,9 %).

Naiset olivat ahkerampia myös mitattaessa koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärää (taulukko 6): 2182 henkilöstä naisia osallistui 67,6 % ja miehiä 32,4 %.

Taulukko 4. Tulostavoitteet ja saavutetut tulokset.

Tavoite	Saavutettu
50 kylää	71 kylää
Yhteensä vähintään 50 kyläsuunnitelmaa, kylätietokansiota, hankesuunnitelmaa ja muita kehittämissuunnitelmia	Yhteensä 55 kpl. 10 kpl kyläsuunnitelmia tekeillä/ päivitettävänä Hanke on työllistänyt 5 henkilötyövuotta
Talkootyötä noin 3000 tuntia	5239 h (josta Pohjois-Suomen Koulutuskeskuksen osuus 70,6 % ja Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskuksen osuus 29,4 %)
Koulutusta kertyy yhteensä 2400 oppilastyöpäivää	2926 oppilastyöpäivää

Taulukko 5. Järjestettyjen koulutusten oppilastyöpäivämäärät 1.10. 2004.

Koulutus	Oppilastyöpäivää Miehet	Oppilastyöpäivää Naiset	Oppilastyöpäivää Yhteensä
Tietotekniikka /ATK-koulutusta / www	448	653	1101 (37,6 %)
Ympäristöosaamiskoulutusta	33	72	105 (3,6 %)
Liiketaloudellinen koulutus	166	795	961 (32,9 %)
Muu koulutus esim. seminaarit	324	435	759 (25,9 %)
Oppilastyöpäiviä Yhteensä	971 (33,2 %)	1955 (66,8 %)	2926 (100 %)
Pohjois-Suomen Koulutuskeskuksen osuus on 914 (31,2%) ja ja Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 2012 (68,8 %) oppilastyöpäivää.			

Taulukko 6. Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä. Tilanne 1.10. 2004.

Miehiä	706 kpl (32,4 %)
Naisia	1476 kpl (67,6 %)
Yht.	2182 kpl (100 %), joista alle 30 vuotiaita 49 kpl eli (2,2 %)

Taulukko 7. Kylävalakiat-hankkeen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Vaikutukset päästöihin	Vesien tilaan ja maaperään oli myönteisiä vaikutuksia ympäristön hoitoon liittyvien talokotöiden kautta.
Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen	Paikallisten uusiutuvien raaka-aineiden ja palveluiden käyttöön hankkeella oli myönteinen vaikutus, koska hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista.
Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin	Maisemaan, kulttuuriympäristöön, luontoaluiden yhtenäisyyteen ja olemassa olevan infran hyväksikäyttöön hankkeella oli myönteinen vaikutus.
Vaikutukset ihmisiin	Elinoloihin ja viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen hankkeella oli suuri myönteinen vaikutus – turvallisuuteen vaikutettiin liikenneoloja parantamalla.
Vaikutukset liikenteeseen	Joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen hankkeella oli myönteinen vaikutus.
Vaikutukset tutkimukseen ja koulutukseen	Ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen oli myönteinen vaikutus.

Hankkeen arvioituja vaikutuksia

Hankkeella arvioitiin olevan huomattavasti ympäristövaikutuksia ja myös sosiaalisia vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen. Myös huomattavia tasa-arvovaikutuksia katsottiin olevan naisten koulutukseen. Tasa-arvovaikutuksia hankkeella oli myös miesten ja naisten työllisyyteen. (Taulukko 7).

Kyliä www-sivustot ja portaali

Hankkeen aikana Oulun ja Raahen seutukuntien alueella valmistettiin Hannuksen (members.tiscali.fi/hannus.kiiminki/), Alakylän (members.surfeu.fi/alakyla.kiiminki/), www.muhos.fi/kylmala/kylasuunnitelma.htm ja Haapajoki-Arkkukarin ([14](http://www.haapajoki-</p>
</div>
<div data-bbox=)

arkkukari.net) www-sivustot.

Hankkeen aikana Ylivieskan alueella valmistettiin Kalajoen Etelänky-
län (www.kalajoki.fi/kylat), Tyngän kylän sivusto (www.tynka.net),
Alavieskan Käännänkylän sivut (www.alavieska.fi) ja Taluskylän
(päivitys, www.alavieska.fi), Kähtävän sivut (www.alavieska.fi) ja
Löytyn kyläyhdistyksen (www.ylivieska.fi) www-sivustot.

Alunperin kaikille sivustoille ei löytynyt palvelinta, johon ne voitai-
siin sijoittaa. Pohdittaessa sijoitusongelmaa, huomattiin, että Pohjois-
Pohjanmaan Kylät ry:llä oli tarve kylätietoa sisältävälle portaalille. Ky-
lävalakiat ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry yhdistivät voimansa ja syntyi
kyläportaali www.ppkylat.fi. Marraskuun alusta 2004 ylläpitovastuu
siirtyi Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:lle, sitä aikaisemmin ylläpitäjä oli
Pohjois-Suomen Koulutuskeskus.

Portaalin sivukuvaukset ovat *liitteessä 3*.

www.ppkylat.fi- portaalisivustossa on tietokanta, jossa on kylien yh-
teystiedot ja linkkiluettelo, joista pääsee kylien omille kotisivuille. Tie-
tokantaa päivitetään jatkuvasti.

Sivustossa on chat-palvelu (rupattelupalvelu) ja jonka avulla haluk-
kaat kyläläiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua.

Sivustossa on tehtiin kyläfoorumiosuus. Foorumiin voidaan jättää
myynti-ilmoituksia kylillä olevista tonteista sekä myydä omia tuotteita
ja tavaroita kyläkirppiksellä. Myös kylien tapahtumista voi ilmoittaa
foorumissa. Foorumissa on myös osio, johon voi halutessaan tehdä eh-
dotuksia palvelujen parantamiseksi tai mahdollisten vikojen ilmoittami-
seksi.

Sivustossa on ohjeistus, jonka tavoitteena on tukea kylien omatoimis-
ta kyläsuunnitelmien laatimista.

Kylä saa tietonsa tietokantaan siten, että kylän yhdyshenkilö täyttää
www.ppkylat.fi-sivustossa olevan lomakkeen ja lähettää sen automaatti-
sesti tarkastettavaksi sivuston vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö tarkastaa
tietojen oikeellisuuden ja sen onko kylä jo ennestään tietokannassa. Mi-
käli tiedot ovat oikein ja kylää ei löydy tietokannasta, lisätään se tieto-
kantaan.

Lisäpalveluna suunnitellaan tietokantaa, johon tallennetaan kylän
karttakoordinaatit ja linkki karttakuvaan, jolloin kylän sijainti tulee nä-
kyviin.

Sivuston takana on työryhmä: Tarja Niskanen, projektipäällikkö, si-
sältötuotanto; Reijo Haarala, kyläsuunnitelmien ohjeistus, haastattelut;
Sami Taipaleenmäki, tuotetun sisällön muuttaminen web-muotoon ja
muu tekninen toteutus. ◀

Julkisuus ja tiedottaminen

Suunnitelmat

Hankesuunnitelmassa määriteltiin pääpiirteittäinen tiedotussuunnitelma, jota tarkennettiin hankkeen käynnistyttyä.

Suunnitelman mukaan hankkeesta tiedotettiin julkisten tiedotusvälineiden, kuntien, osoitteellisten kylätoimikuntien, kylien kehittämissorganisaatioiden ja muiden tarpeen vaatimien kanavien kautta.

Hankkeen käynnistymisvaiheessa toimitettiin hanke-esitys edellä mainituille.

Kunnissa järjestettiin tiedotustilaisuuksia. Hankkeelle valmistettiin www-sivusto, joka on sijoitettu Pohjois-Suomen Koulutuskeskuksen kotisivuston alle osoitteeseen www.psk/kylavalakiat. Myös Kalajokilaakson ammatillisella aikuiskoulutuskeskuksella on oma Kylävalakiat-sivusto osoitteessa www.aiku.ppnet.fi.

Hankkeelle rakennettiin oma graafinen ilme, jossa on huomioitiin EMOTRin edellyttämät viestintä- ja tiedotusohjeet.

Hankkeesta tehtiin yleisesite. Koulutus- ja tiedotustapahtumista tehtiin omat A4-kokoiset esitteet. Koottiin esitekansio.

Hankkeen aikana tiedotettiin sopivin väliajoin edellisten kanavien kautta ja päivitettiin www-sivustoa.

Tiedotusvälineille ja yhteistyökumppaneille tehtiin tiedotteita tarpeen mukaan.

Lehdistötiedotteen ja esitteen voimilla kyliä aktivoitiin mukaan toimintaan.

Hankkeen päätösvaiheessa laadittiin loppuraportti ja järjestettiin lehdistötilaisuus.

Kirsi Hakkaraisen kesällä 2004 tekemän hankkeen väliarvioinnin mukaan 79% oli sitä mieltä, että tiedottaminen hankkeen ja kylien välillä oli onnistunut hyvin. Kylän sisällä hankkeen tapahtumista tiedottaminen oli onnistunut 74 %:n mielestä hyvin tai melko hyvin.

Tuotokset

Hankkeen alussa 1.11. 2001 järjestettiin hankkeen aloitukseen liittyvä ensimmäinen tiedotustilaisuus Liminganlahden luontokeskuksessa. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin aina kyläsuunnitelman julkistamisen yhteydessä. Useita tiedotustilaisuuksia järjestettiin myös kunnittain – osa

niistä järjestettiin yhteistyössä kehittämissyhdistyksen kanssa.

Kyläviesti –lehti valmistettiin yhteistyössä kylien työohjelman kanssa. Mukana olivat myös Kylävalakeat tavoite 1-hanke ja Asu Kylässä –hanke.

Useat paikallislehdet ja maakuntalehdistä ainakin Kaleva kirjoittivat useita lehtijuttuja Kylävalakeista. Leikekansiot löytyvät oppilaitoksista.

Tiedottamisessa ja markkinoinnissa käytettiin apuna ajantasaisia sähköpostiosoitelijoita. Sähköposti todettiin nopeaksi ja toimivaksi tiedotusvälineeksi.

Hankkeen loppuraportti julkistettiin 25.11. 2004 Oulussa Pohjois-Suomen Koulutuskeskuksessa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin saman päivän iltana Vihannin Ukonsantissa.

Oulun ja Raahen seutukuntien tuotoksia:

- [Www.psk.fi/kylavalakiat](http://www.psk.fi/kylavalakiat) -sivusto
- [Www.ppkylat.fi](http://www.ppkylat.fi) –sivusto
- Kylävalakeat -hankkeen tiedotussuunnitelma
- Kyläsuunnitelman laatiminen-materiaali
- Kyläsuunnitelmia eri kyliin
- Radiojuttuja: Radio Suomen Oulun aluetoimitus ja Radio Pooki
- Arviointi Kylävalakiat –hankkeesta 2002-2004, Kirsi Hakkarainen.

Ylivieskan seutukunnan tuotoksia:

- Kylävalakiat www-sivu osoitteessa www.aiku.ppnet.fi
- Kylätiedotteita 30 kappaletta 30.9. 2004 mennessä
- Kaksi alueellista Kyläviesti –lehteä Oulun eteläisessä yhteistyössä Nivala-Haapajärven seutukunnassa toteutettavan Kylävalakiat-hankkeen kanssa. Lehdet jaettiin alueiden jokaiseen talouteen.
- Lehdistössä julkaistiin lehtijuttuja kylälogokilpailusta, Kähtävän kylästä, retkestä Kierikkikeskukseen ja Etelänkylän investointihankkeesta.
- Kesätapahtumia kylillä 2003 julkaistiin Oulun Eteläisessä.
- Kyläsuunnitelmia eri kyliin
- Radiojuttu Kylävalakeista ja kylillä tehtävistä töistä Radio Keski-Pohjanmaahan. ◀

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Kylävalakiat –hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet kyläyhdistykset. Kyläyhdistysten kanssa on sovittu toimenpiteistä. Heidän kautta on koottu kyläläisiä kokoon ja laadittu kyläsuunnitelmia. Kyläyhdistykset ovat toimineet myös tiedonvälittäjinä hankkeen ja kyläläisten välillä.

Yhteistyö kuntien ja Ylivieskan seutukunnan kanssa on liittynyt kyläen kehittämistoimien eteenpäin viemiseen. Kunnan luottamus- ja virkamiehet ovat osallistuneet Kylävalakeitten tilaisuuksiin esim. kyläsuunnitelmien laatimisessa ja julkistamistilaisuuksissa. Päävastuu yhteistyöstä kuntien luottamus- ja virkamiesten kanssa on ollut kylillä itsellään. Kunnat ja Ylivieskan seutukunta ovat ”henkisen” tuen lisäksi osallistuneet kuntarahoitusosuuteen.

Maakunnallinen kyläohjelma, jota koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto/kyläkoordinaattori Kaisa Uusioja on tukenut ja edesauttanut Kylävalakiat -hankkeen toteuttamista. Toiminnallista yhteistyötä on tehty mm. koulutustilaisuuksien osalta sekä kyläpäivien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kylävalakiat –hanke on osallistunut maakunnallisen kyläohjelman työstämiseen vuosille 2004-2007.

Jomma ry, Nouseva Rannikkoseutu ry sekä Rieska - Leader ry -kehittämisyhdistykset ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppaneita kun on ollut kyse tiedottamisesta tai hanketoiminnasta. Kehittämisyhdistysten kanssa on pidetty yhteisiä tiedotustilaisuuksia. Hanketoiminnassa on tehty tiivistä yhteistyötä kylien hyväksi.

Kyläasiamiehet ja muiden hankkeiden vetäjien kanssa yhteistyö on ollut myös toimivaa. Kyläsuunnitelmat ovat tukeneet kyläasiamiesten toimintaa. Ja muiden hankkeiden kanssa on pyritty yhteistyöhön ja samalla vältetty päällekkäistä työtä. Ylivieskan seutukunnassa on tehty yhteistyötä Nivala- Haapajärven seutukunnan Kylävalakiat –hankkeen kanssa mm. tiedottamisen ja Logo-kilpailun osalta. Näin on voitu saada tietoa koko Oulun Eteläiselle. ◀

Projektin kustannukset ja rahoitus

Hyväksytty julkinen rahoitus

Julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 89,29 % eli enintään 325.191,37 euroa. Siitä EU:n Alma-ohjelman (EMOTR-t) rahoitusosuus on 30,00% eli enintään 97.548,99 euroa. Val-

tion rahoitusosuus on 60,18% eli enintään 195.686,66 euroa. Kuntien rahoitusosuus on 9,83% eli enintään 31.955,72 euroa. Muu julkinen rahoitusosuus on 0,00% eli enintään 0,00 euroa.

Hyväksytty yksityinen rahoitusosuus

Yksityinen rahoitusosuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 10,71% eli enintään 39.019,57 euroa. ◀

Taulukko 8. Projektin kustannusten ja rahoituksen toteutuman tilanne 31.10.2004.

		Päätöksen mukainen budjetti /€	Toteutunut/€
Vuosi 2001	Palkat ja sivukulut	14 464,16	14 164,55
	Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut	1 177,32	1 176,47
	Matkakulut	4 927	4 709,30
	Luontoissuoritukset, talkootyö	0	-
	Muut kulut	3 952,41	2 613,76
	Kokonaiskustannukset	24 521,8	22 664,08
	Hyväksyttävät kustannukset yhteensä	24 521,8	22 664,08
	Erotus		1 857,72
Vuosi 2002	Palkat ja sivukulut	76 189,13	67 203,44
	Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut	20 014,36	10 503,90
	Matkakulut	12 614,09	10 368,52
	Luontoissuoritukset, talkootyö	13 791,41	11 988,87
	Muut kulut	8 947,59	9 124,79
	Kokonaiskustannukset	131 556,58	114 366,89
	Hyväksyttävät kustannukset yhteensä	131 556,58	114 366,89
	Erotus		17 189,69
Vuosi 2003	Palkat ja sivukulut	75 684,57	64 666,61
	Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut	19 846,18	25 913,48
	Matkakulut	12 614,09	11 517,16
	Luontoissuoritukset, talkootyö	11 773,15	11 563,59
	Muut kulut	8 493,49	4 037,52
	Kokonaiskustannukset	128 411,48	126 131,46
	Hyväksyttävät kustannukset yhteensä	128 411,48	126 131,46
	Erotus		2280,02
Vuosi 2004	Palkat ja sivukulut	38 851,41	54 373,11
	Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut	11 100,4	10 683,27
	Matkakulut	8 493,49	10 833,10
	Luontoissuoritukset, talkootyö	10 091,28	9 503,88
	Muut kulut	11 184,5	8 966,56
	Kokonaiskustannukset	79 721,08	94 359,92
	Hyväksyttävät kustannukset yhteensä	79 721,08	
	Kaikki kustannukset yhteensä	364 210,94	357 522,35
Koko hankkeen kustannukset yhteensä kustannuslajeittain			
	Palkat ja sivukulut	205 189,27	200 407,71
	Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut	52 138,26	48 277,12
	Matkakulut	38 649,58	37 428,08
	Luontoissuoritukset, talkootyö	35 655,84	33 056,34
	Muut kulut	32 577,99	38 353,10
	Kokonaiskustannukset	364 210,94	357 522,35
	Hyväksyttävät kustannukset yhteensä	364 210,94	357 522,35

Hankkeen synnyttämät jatkotoimenpiteet

Kylävalakiat-hankkeelle on suunniteltu jatkohanke, Kylävalakiat II.

Jatkohanke jatkaa Kylävalakian viitoittamalla tiellä, kuitenkin painopisteenä on kylien elinkeinotoiminnan kehittäminen ja palveluiden tuotteistaminen sekä markkinointi.

Kylävalakiat II:n puitteissa jatketaan keskenjääneiden kyläsuunnitelmien työstämistä ja vanhoja päivitetään. Erityisesti pyritään saamaan mukaan passiiviset kylät ja aktivoidaan niitä suunnitelmalliseen kehittämiseen. Kylien välistä yhteistoimintaa stimuloidaan. Edistetään kylien ja kaupunkien vuorovaikutusta.

Kyläsuunnitelmien määrällisten tavoitteiden toteuttaminen jatkuu ja sitä kautta syntyy tuloksia.

Kylävalakiat II kestoksi on ajateltu 1.10. 2004 – 31.12. 2005. Hankkeen toiminta-alue on Ylivieskan, Raahen ja Oulun seutukunnat. Rahoitus on suunniteltu tulevaksi Emotr/Almasta, mukaan tulevista kunnista ja kylistä. Hankkeen toteuttaa Pohjois-Suomen Koulutuskeskus.

Päätöstä jatkohankkeesta ei ole saatu Kylävalakiat –loppuraportin valmistamisen aikana. ◀


Kuvia matkan varrelta





Liite 1.

Kylävalakiat-hankkeessa mukana olevat kylät on merkitty karttaan kolmiolla.

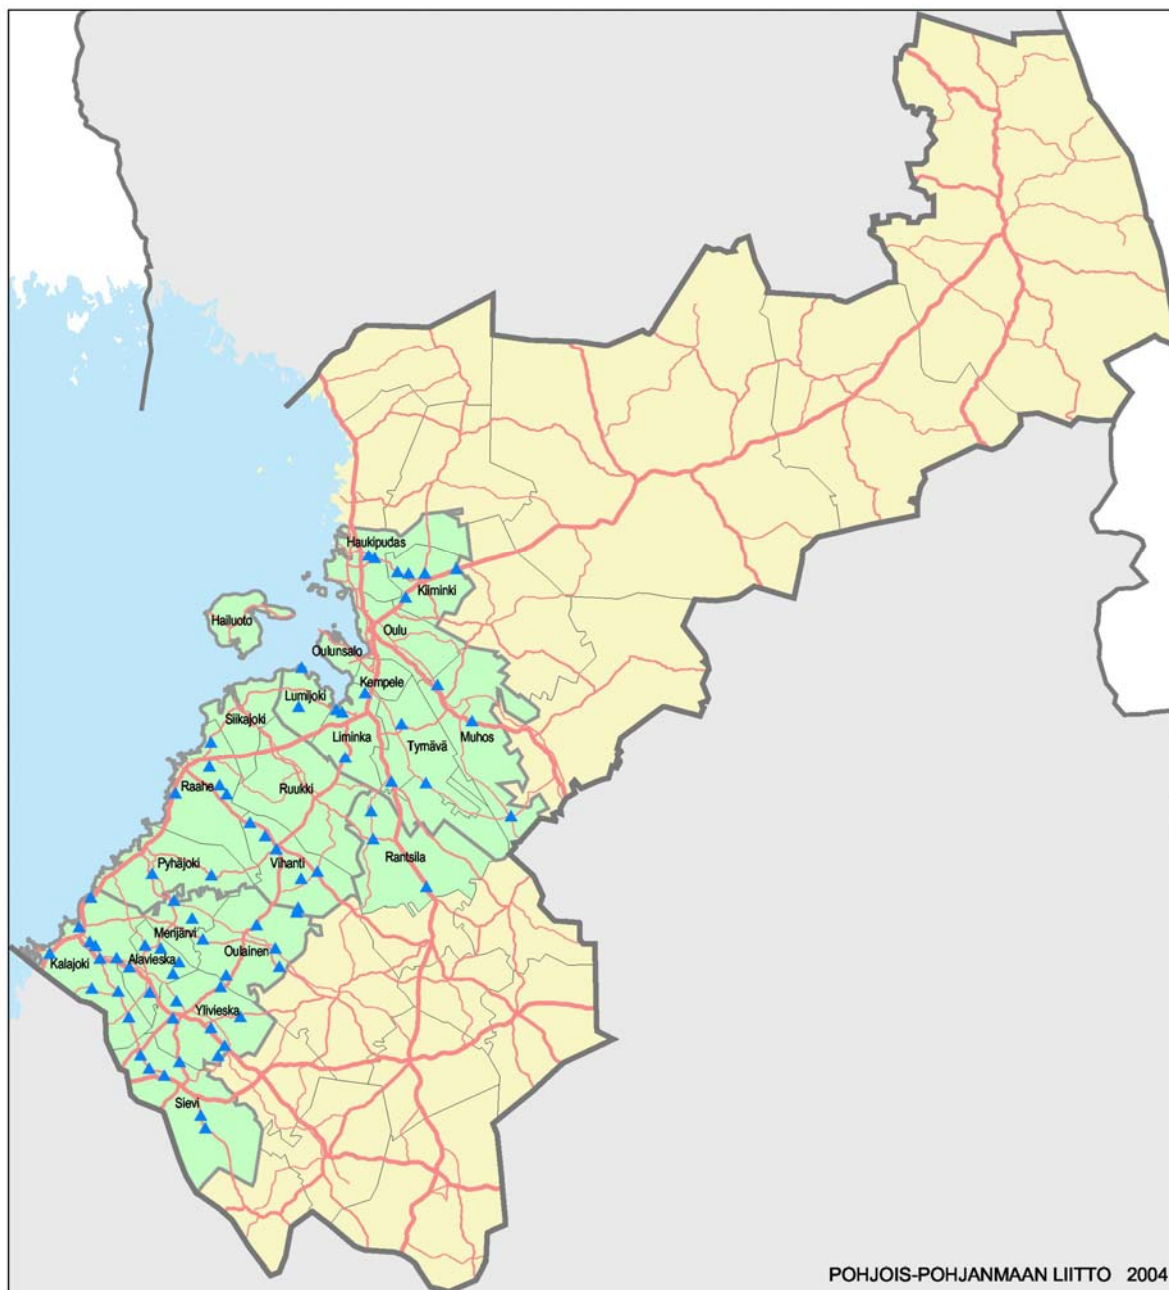

Liite 2...

Kyläsuunnitelma-, hankesuunnitelma- ja koulutustilanne kylittäin 1.10. 2004. * Tähdellä merkityillä kylillä on vanhat kyläsuunnitelmat olemassa...

Kunta	Kylä	Kyläsuunnitelma			Koulutus				
		Valmis	Tekeillä/päivitys	Hankesuunnitelu	Tietotekniikka/ATK/www	Ympäristöosaamista	Liiketaloudellinen	Muu esim. seminaarit	Muuta esim. rekisteröityminen
Vihanti	Alpua	X		X			X	X	
	Möykkylä	X		X			X		
	Lampinsaari	X		X	X		X	X	
	Läntisranta	X		X			X	X	
	Myllyperä-Perukka	X		X					
	Ilveskorpi						X	X	
	Korvenkylä						X		
	Kilpua						X		
	Kirkonkylä					X	X		
	Lumimetsä						X		
Muhos	Jokirinne			X			X	X	
	Kymälänkylä	X			X		X	X	X
	Mäntyrinta-Honkala		X				X	X	
Lumijoki	Varjakka	X				X	X	X	X
	Ylipää				X		X		
	Lapinkylä							X	
Kiiminki	Jääli	X		X		X	X	X	
	Talkkunamaa					X		X	
	Alakylä	X			X		X	X	
	Hannus	X			X		X	X	
	Tirinkylä	X						X	
Haukipudas	Jokikylä	X						X	
Pyhäjoki	Pirttikoski							X	
	Liminkakylä							X	
Raahe	Haapajoki-Arkkukari	X			X		X	X	
Liminka	Rantakylä-Virkkula	X				X		X	X
	Tupos							X	
Pattijoki	Jokela		X					X	
	Kopsa	X			X		X	X	
	Olkijoki	X			X			X	
	Ylipää/Lasikangas	X			X			X	

...Liite 2

...Kyläsuunnitelma-, hankesuunnitelma- ja koulutustilanne kylittäin 1.10. 2004. * Tähdellä merkityillä kylillä on vanhat kyläsuunnitelmat olemassa.

Tymävä	Suutarinkylä	X							
	Temmes		X						
	Murto							X	X
Alavieska	Kähtävä	X		X	X		X	X	X
	Talus	X		X	X		X	X	
	Kääntä	X		X	X		X	X	X
	Somero	X	X	X	X		X		
	Jukulainen		X		X		X	X	
	Saarenkylä		X				X		
Kalajoki	Etelänkylä	X		X	X		X	X	
	Tynkä	X			X		X	X	
	Vasankari	X		X	X		X	X	
	Rautio	X		X			X	X	
	Typpö						X	X	
	Kärkinen			X			X	X	
	Pitkäsenkylä							X	
	Rahja	X		X	X		X	X	
	Käännänkylä *				X			X	
	Plassi			X			X	X	
	Mehtäkylä			X					
	Pohjankylä		X						
Sievi	Leppälä *			X			X	X	
	Asemakylä Kenkäkangas		X	X			X		X
	Sievinkylä *						X	X	
	Kiiskilä-Karjula				X				
	Jyrinki		X	X					
Ylivieska	Löytty *			X	X		X	X	
	Kangas *			X	X			X	
	Kantokylä	X						X	
	Raudaskylä *							X	
	Niemelänkylä	X		X					
	Sorvisto		X		X				
Oulainen	Petäjäskoski *						X	X	
	Kytöhanhi	X		X				X	
	Käpylä-Kaura *							X	
	Matkaniva *							X	
	Mäyrä *				X			X	
	Piipsjärvi *							X	
Merijärvi	Pyhäkoski *						X	X	
	Kalapudas *							X	
Yhteensä	71	30	10	25	24	5	39	53	7

Liite 3.

www.ppkylat.fi-sivuston kuvaus sivuittain.

Sivuston sivu	Sivun kuvaus
Etusivu	Portaalin etusivu
Juttelupalsta	Reaaliaikainen ja interaktiivinen keskustelupalsta
Keskustelupalsta	Tonttipörssi; Kyläkirppis: Ostetaan ja vaihdetaan Vuokrataan/annetaan vuokralle; Yleiset: yleiset keskustelut; Tapahtumat: ilmoitukset kylän tapahtumista; Kyläläisten henkilökohtaiset kotisivut; Matkailu: Pohjois-Pohjanmaalla toimivien maaseutumatkailuyritysten linkkejä; Yritykset: Pohjois-Pohjanmaan kylissä toimivien yritysten linkkejä; Harrastukset: keskustelua harrastuksista; Sivuston ylläpidon tiedotuksia; Kyselyosio; Palaute; Parannusehdotuksia sivustoon; Sivuston käyttöä koskevat kysymykset
Webmail	Sähköposti
Ohjeita	Sivuston käyttöön liittyvää ohjeistusta
Linkit	Yhteistyötahot, rahoittajat ja muut
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry Jäsenhakemus	
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry Pöytäkirjat	
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry Hallituksenjäsenet	
Kylälinkit	Kylätietokanta ja kylien internet-osoitteet
Kylät kunnittain	Kylätietokanta
Lisää kylä	Kylätietokantaan tulevan uuden kylän tiedot
Suunnitelma ja "hiippalakkimalli". Haastattelut pääsivu, Kaisa Uusioja, Tarja Niskanen, Maija Isokääntä ja Outi Levä	Ohjeita kyläsuunnitelman laatimiseen. Kylien kehittämiseen ja kyläsuunnitelmiin liittyviä haastatteluja
Kyläsuunnitelman toteuttaminen Kyläkysely.doc; Maisema ja sijainti; Kylä tilastojen valossa: Asukkaat, palvelut, elinkeinot, yritykset, järjestöt ja yhdistykset; Historia, nykytila, tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteet, visio, tavoitteet; Toimenpiteet	Kyläsuunnitelman tekoon liittyvää ohjeistusta ja jäsentelyä.

Lisätietoja

Hallinnoija:

Pohjois-Suomen Koulutuskeskus
Kansankatu 47 B, 3 krs, 90100 Oulu
Projektipäällikkö Tarja Niskanen
Puh. 044 312 0750

Ylivieskan seutukunta:

Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Leena Isopahkala
Opintie 2, 85100 Kalajoki
050 520 4405
